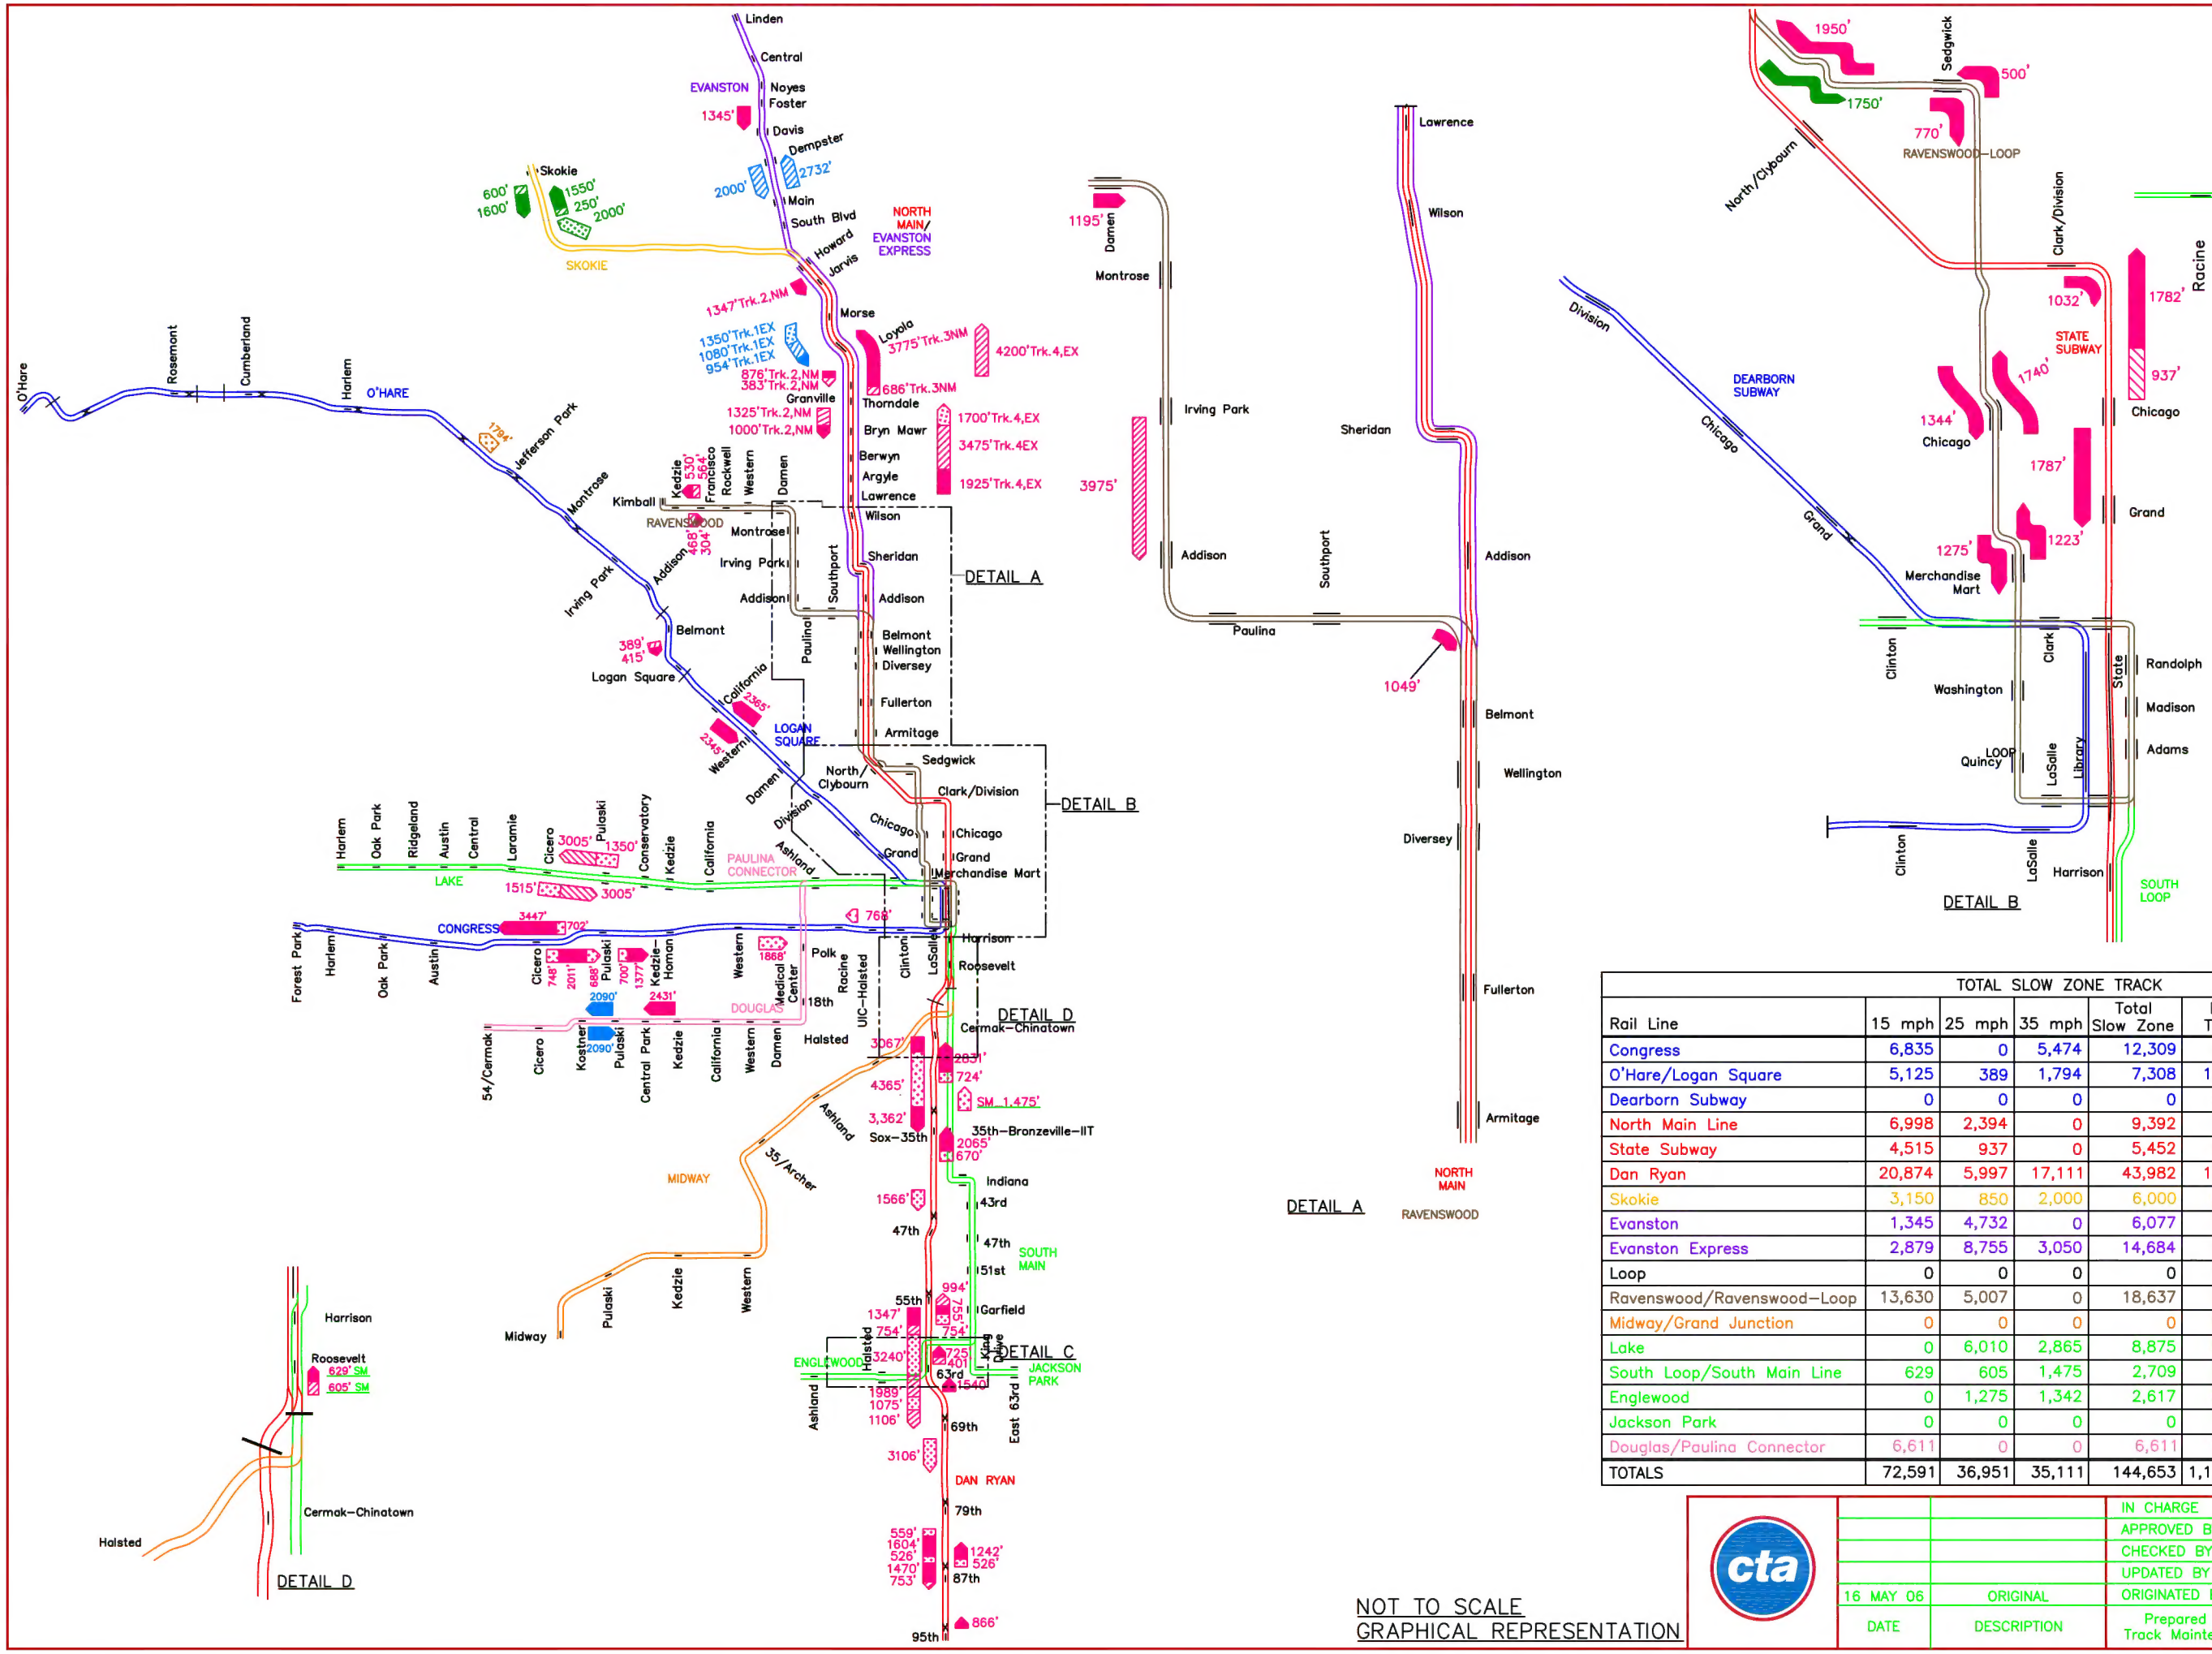

SLOW ZONE BY AREA				
Track (CTA)	15 mph	62,557	122,813	
	25 mph	30,289		
	35 mph	29,967		
Structure (CTA)	15 mph	5,134	12,296	
	25 mph	5,812		
	35 mph	1,350		
Signal (CTA)	15 mph	0	1,794	
	25 mph	0		
	35 mph	1,794		
Power (CTA)	15 mph	0	0	
	25 mph	0		
	35 mph	0		
Construction (CTA/Contractor)	15 mph	4,900	7,750	
	25 mph	850		
	35 mph	2,000		

TOTAL SLOW ZONE TRACK

Rail Line	15 mph	25 mph	35 mph	Total Slow Zone	Linear Trk.–Ft.	% Slow	Movement Removed	Movement Added	Total SZ	% Slow
Congress	6,835	0	5,474	12,309	94,010	13.1	1,178	3,447	19,617	6.7
O'Hare/Logan Square	5,125	389	1,794	7,308	152,956	4.8	0	0		
Dearborn Subway	0	0	0	0	45,818	0	0	0		
North Main Line	6,998	2,394	0	9,392	78,966	11.9	0	0	58,826	25.4
State Subway	4,515	937	0	5,452	51,328	10.6	5,500	4,207		
Dan Ryan	20,874	5,997	17,111	43,982	101,332	43.3	1,293	0		
Skokie	3,150	850	2,000	6,000	52,146	11.5	1,150	4,000	6,000	11.5
Evanston	1,345	4,732	0	6,077	40,714	14.9	0	1,345	20,761	20.4
Evanston Express	2,879	8,755	3,050	14,684	60,970	24.1	0	0		
Loop	0	0	0	0	21,470	0	0	0	0	0
Ravenswood/Ravenswood–Loop	13,630	5,007	0	18,637	98,364	18.9	0	1,336	18,637	18.9
Midway/Grand Junction	0	0	0	0	99,224	0	0	0	0	0
Lake	0	6,010	2,865	8,875	93,114	9.5	0	0	14,201	6.9
South Loop/South Main Line	629	605	1,475	2,709	68,906	3.9	0	0		
Englewood	0	1,275	1,342	2,617	31,916	8.2	0	0		
Jackson Park	0	0	0	0	12,162	0	0	0		
Douglas/Paulina Connector	6,611	0	0	6,611	77,710	8.5	0	0	6,611	8.5
TOTALS	72,591	36,951	35,111	144,653	1,181,106	12.2	7,828	16,036		

NOT TO SCALE
GRAPHICAL REPRESENTATION

DATE	DESCRIPTION	
		IN CHARGE C.B.
		APPROVED BY B.M.jr
		CHECKED BY B.M.jr
		UPDATED BY S.M.
16 MAY 06	ORIGINAL	ORIGINATED BY J.J.H.
DATE	DESCRIPTION	Prepared by: Track Maintenance

CTA RAIL CUSTOMER IMPACT MAP

July 13 , 2011
